РЕСУРС
инновационная группа

ДОРОЖНАЯ КАРТА · ОКТЯБРЬ 2026 – МАРТ 2028

Закон о надпутевом строительстве

План мероприятий по разработке и продвижению законопроекта: 20 этапов, три блока, два маршрута внесения в Государственную Думу

Редакция от 20 октября 2026 года · для внутреннего обсуждения

01

Полтора года
от решения до подписания закона

18 МЕС.

от решения РЖД в октябре 2026 до подписания в марте 2028

20 ЭТАПОВ

в трёх блоках: ведомства, Правительство, парламент

11 ИЗ 20

этапов идут с участием группы «Ресурс»

–6 МЕС.

срок внесения при депутатском маршруте

БЛОК 1

Подготовка концепции, разработка и согласование в ведомствах

Октябрь 2026 – июль 2027

13 ЭТАПОВ

БЛОК 2

Правительство РФ и Администрация Президента

Август – октябрь 2027

3 ЭТАПОВ

БЛОК 3

Государственная Дума и Совет Федерации


Ноябрь 2027 – март 2028

4 ЭТАПОВ

02

Весь путь на одной шкале

● участвует «Ресурс» | сегодня, 20 октября 2026

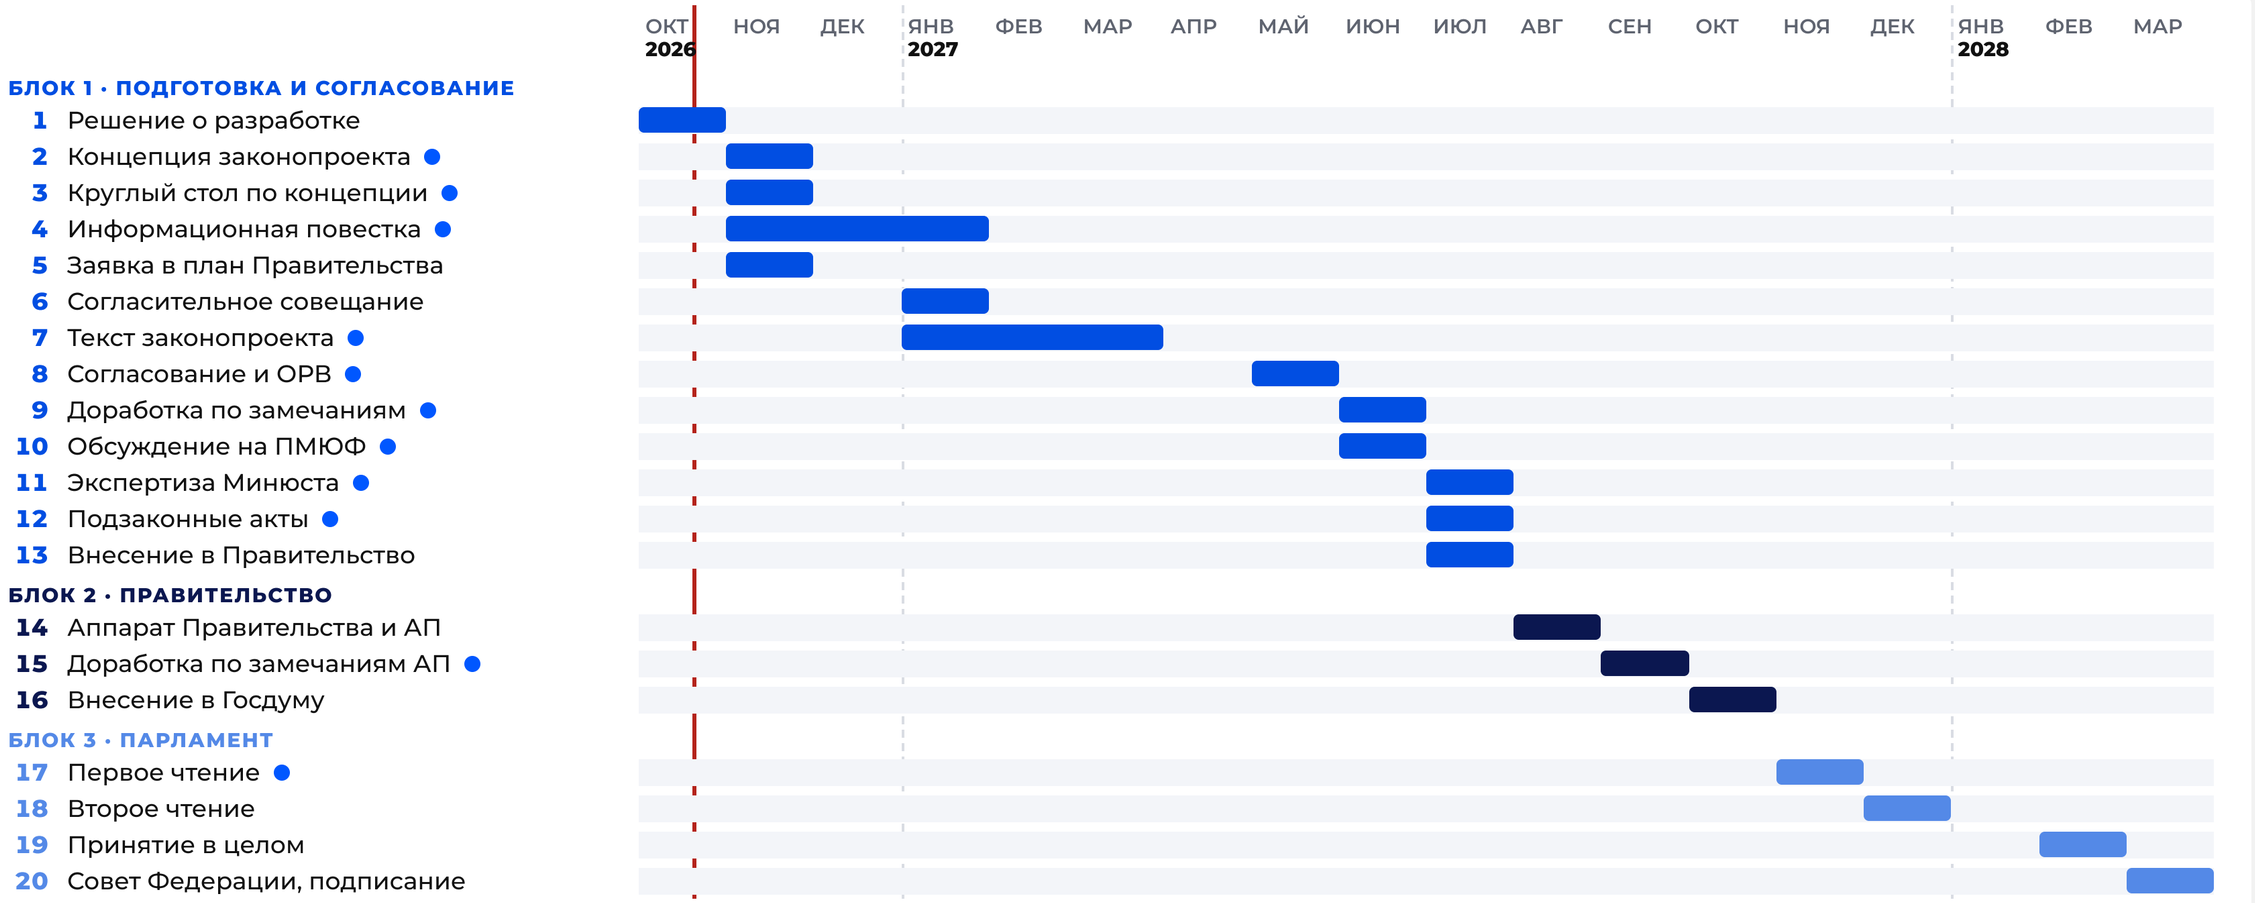

Концепция и площадки
октябрь 2026 – январь 2027

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
01	Принятие решения о разработке законопроекта	Октябрь 2026	РЖД
02	Разработка концепции законопроекта для направления в ведомства	Ноябрь 2026	РЖД, «Ресурс»
03	Круглый стол в Минтрансе или профильном комитете Государственной Думы: предварительное обсуждение концепции с заинтересованными ведомствами и организациями	Ноябрь 2026	Госдума, Минтранс, РЖД, «Ресурс»
04	Комплекс мероприятий для позитивной новостной повестки по законопроекту; выявление факторов, которые ускоряют или тормозят его рассмотрение	Ноябрь 2026 – январь 2027	«Ресурс», РЖД
05	Предложения о включении законопроекта в план законопроектной деятельности Правительства РФ на 2027 год	Ноябрь 2026	Минтранс, Минстрой, Минюст, РЖД
06	Согласительное совещание по концепции законопроекта	Январь 2027	Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Минюст, Росреестр, Росжелдор, Росимущество

Текст, согласование, экспертиза
январь – июль 2027

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
07	Разработка законопроекта на основе согласованной концепции и направление его в заинтересованные органы власти	Январь – март 2027	РЖД, «Ресурс»
08	Согласование законопроекта, процедура оценки регулирующего воздействия	Май 2027	Минстрой, заинтересованные ведомства, РЖД, «Ресурс», заинтересованные организации
09	Доработка законопроекта по итогам замечаний, если они поступят	Июнь 2027	Минстрой, РЖД, «Ресурс»
10	Обсуждение законопроекта и особенностей регулирования отрасли на Петербургском международном юридическом форуме для ускорения принятия	Июнь 2027	Минюст, Минтранс, «Ресурс»
11	Правовая экспертиза законопроекта в Минюсте и доработка по её итогам, если потребуется	Июль 2027	Минюст, Минстрой, РЖД, «Ресурс»
12	Обсуждение необходимых подзаконных актов и подготовка к упреждающему подзаконному регулированию	Июль 2027	Минтранс, «Ресурс»
13	Внесение законопроекта в Правительство РФ	Июль 2027	Минстрой

Правительство и парламент
август 2027 – март 2028

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
14	Рассмотрение законопроекта в Аппарате Правительства и направление в Администрацию Президента РФ	Август 2027	Аппарат Правительства
15	Доработка законопроекта с учётом замечаний Администрации Президента РФ, если они поступят	Сентябрь 2027	Аппарат Правительства; Минстрой; Минтранс; РЖД; «Ресурс»
16	Одобрение на заседании Правительства и внесение законопроекта в Государственную Думу	Октябрь 2027	Правительство РФ
17	Рассмотрение в комитетах Государственной Думы, принятие в первом чтении, подготовка рабочих и аналитических материалов	Ноябрь 2027	Госдума; профильный комитет ГД; «Ресурс»
18	Подготовка ко второму чтению, правовая и лингвистическая экспертиза	Декабрь 2027	Госдума; профильный комитет ГД
19	Принятие закона Государственной Думой в целом	Февраль 2028	Госдума; профильный комитет ГД
20	Одобрение Советом Федерации, подготовка рабочих и аналитических материалов, подписание и опубликование	Март 2028	Совет Федерации; Администрация Президента

04

Депутатский маршрут
минус полгода до внесения



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Законопроект вносят депутаты после согласования с ведомствами. По оценке плана это сокращает срок внесения на 6 месяцев даже с учётом отзыва Правительства РФ.

КТО ВЕДЁТ

Депутаты ГД, Минстрой, Минтранс, РЖД. При том же темпе в парламенте закон можно принять в осеннюю сессию 2027 года.

УСЛОВИЕ

6 месяцев выходят, если депутаты вносят проект в апреле 2027 года, сразу после разработки текста. Если ждать согласования и ОРВ в мае и доработки в июне, выигрыш около 3–4 месяцев.

05

Роль группы «Ресурс» от концепции до первого чтения

11 из 20 этапов

«Ресурс» готовит концепцию и текст, ведёт площадки обсуждения и информационную повестку, сопровождает согласования и первое чтение.

Концепция и текст законопроекта

2	Концепция законопроекта	Ноябрь 2026	7	Текст законопроекта	Январь – март 2027
9	Доработка по замечаниям	Июнь 2027	11	Экспертиза Минюста	Июль 2027

Площадки и информационная повестка

3	Круглый стол по концепции	Ноябрь 2026
4	Информационная повестка	Ноябрь 2026 – январь 2027
10	Обсуждение на ПМЮФ	Июнь 2027

Согласования и доработка

8	Согласование и ОРВ	Май 2027
15	Доработка по замечаниям АП	Сентябрь 2027

Подзаконное регулирование

12	Подзаконные акты	Июль 2027

Сопровождение в Государственной Думе

17	Первое чтение	Ноябрь 2027

06

Кто за что отвечает
участие в этапах по блокам

	ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ													ПРАВИТЕЛЬСТВО			ПАРЛАМЕНТ				
УЧАСТНИК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	ВСЕГО
«Ресурс»	·	■	■	■	·	·	■	■	■	■	■	■	·	·	■	·	■	·	·	·	11
РЖД	■	■	■	■	■	·	■	■	■	·	■	·	·	·	■	·	·	·	·	·	10
Минстрой	·	·	·	·	■	■	·	■	■	·	■	·	■	·	■	·	·	·	·	·	7
Минтранс	·	·	■	·	■	■	·	·	·	■	·	■	·	·	■	·	·	·	·	·	6
Минюст	·	·	·	·	■	■	·	·	·	■	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4
Другие ведомства	·	·	·	·	·	■	·	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2
Правительство	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	■	·	·	·	·	3
Госдума	·	·	■	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	■	■	·	4
СФ и АП	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	■	1

«Другие ведомства»: Минфин, Минэкономразвития, Росреестр, Росжелдор, Росимущество и заинтересованные организации.

07

Ближайшие 90 дней
что нужно решить сейчас

Октябрь 2026	01	**Решение о разработке**	РЖД
Ноябрь 2026	02	**Концепция законопроекта**	РЖД · «Ресурс»
Ноябрь 2026	03	**Круглый стол по концепции**	Госдума · Минтранс · РЖД · «Ресурс»
Ноябрь 2026 – январь 2027	04	**Информационная повестка**	«Ресурс» · РЖД
Ноябрь 2026	05	**Заявка в план Правительства**	Минтранс · Минстрой · Минюст · РЖД
Январь 2027	06	**Согласительное совещание**	Минстрой · Минтранс · Минфин · Минэкономразвития · Минюст · Росреестр · Росжелдор · Росимущество

Решения

1. **Решение РЖД о разработке законопроекта.**
   Пункт 1 стоит на октябрь 2026 года, от него зависит весь график.
2. **Головное ведомство.**
   Минстрой или Минтранс: в плане ведущая роль распределена по-разному.
3. **Площадка круглого стола.**
   Минтранс или профильный комитет новой Думы, ноябрь 2026 года.
4. **Маршрут внесения.**
   Правительственный или депутатский: разница до полугода.

Приложение

Что уточнить до утверждения плана

01 Кто головное ведомство: Минстрой или Минтранс? В пункте 5 первым стоит Минтранс, в пунктах 8, 13 и 16 ведёт Минстрой.

02 Принято ли решение РЖД по пункту 1? Он стоит на октябрь 2026 года, и от него зависит весь график.

03 Даты ПМЮФ 2027 года не объявлены. В последние годы форум проходил то в мае, то в июне.

04 Апрель 2027 года в плане пустой. Согласование и ОРВ можно начать сразу после разработки текста в марте.

05 Выигрыш депутатского маршрута в 6 месяцев сходится только при внесении в апреле 2027 года.
